



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение № 13/1-ЭАМ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации регионального проекта Иркутской области «Чистая вода» за 2022 год.

06.02.2023

г. Иркутск

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее – КСП области) в соответствии с планом деятельности КСП области на 2023 год, в рамках полномочий, установленных для органов внешнего государственного финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» (с изменениями и дополнениями).

Предметом проведения ЭАМ является деятельность министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области и органов местного самоуправления по реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Иркутской области.

Для проведения ЭАМ использованы отчетные данные об исполнении областного и местных бюджетов (ф. 0503117, ф. 0503117-НП), отчеты об исполнении бюджета министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (ф.0503127), данные ГИС, ЕИС, официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иные данные.

Целью проведения мероприятия является анализ реализации регионального проекта «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода») на территории Иркутской области.

К объектам экспертно-аналитического мероприятия относятся министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области и органы местного самоуправления Иркутской области.

Анализируемый период: январь - декабрь 2022 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия.

1. Анализ ресурсного обеспечения, бюджетных ассигнования и целевых показателей РП «Чистая вода», установленных в ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (с указанием объектов водоснабжения и уровня софинансирования).

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы (далее – госпрограмма, ГП) утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от


11.12.2018 № 915-пп. На дату проведения экспертно-аналитического мероприятия госпрограмма утверждена в редакции постановления Правительства Иркутской области от 19.12.2022 № 1022-пп.

В структуру госпрограммы включены 8 подпрограмм, в том числе подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» на 2019 - 2024 годы (далее – ПП, подпрограмма) целью которой является организация повышения качества питьевой воды для населения Иркутской области.

В состав подпрограммы входит одно основное мероприятие - реализация РП «Чистая вода». Ответственным исполнителем подпрограммы и РП «Чистая вода» является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство).

Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2022 год в редакции госпрограммы от 19.12.2022 № 1022-пп без учета средств местных бюджетов составило **1 682 649,4 тыс. р.**, том числе: ОБ - 67 631,4 тыс. р. и ФБ - 1 615 018,0 тыс. р. По сравнению с 2021 годом ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» **увеличено на 1 114 813,9 тыс. р. или 196,3%** (в 2021 году ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» предусмотрено в сумме 567 835,5 тыс. р.).

Динамика изменений ресурсного обеспечения РП «Чистая вода» в период с 2019 года по 2022 год в разрезе источников приведена на графике (без учета средств местных бюджетов и внебюджетных источников).

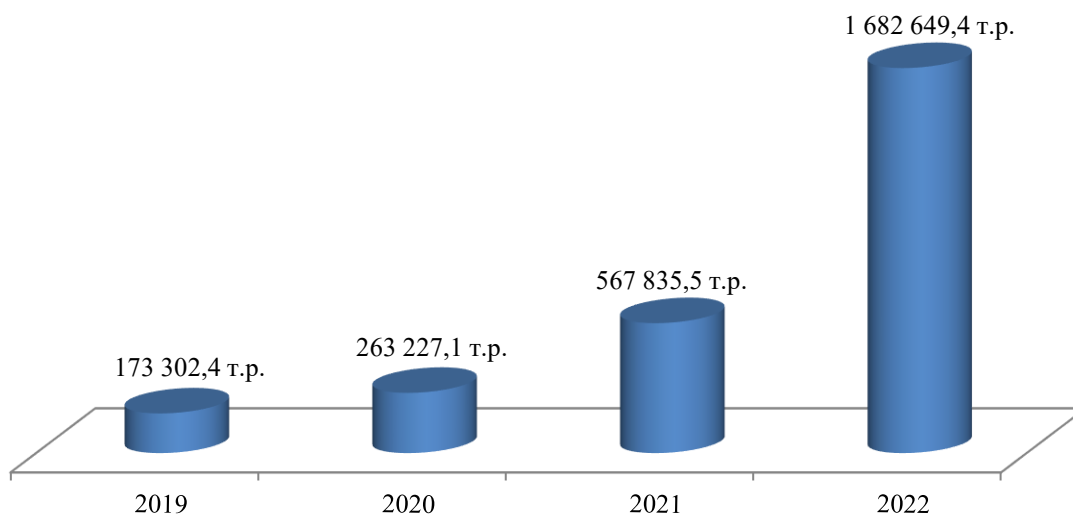

Как видно из диаграммы объемы финансирования РП «Чистая вода» с 2019 года по 2022 год выросли на 870,9%. (с 173 302,4 тыс. р. до 1 682 649,4 тыс. р.).

В разрезе муниципальных образований Иркутской области (далее – МО) ресурсное обеспечение распределено в ГП следующим образом, таблица

№	Наименование округов, районов, поселений.	Всего	ОБ	ФБ	МБ	тыс. р.		
						% соотношение, %		
						ОБ	ФБ	МБ
1	Поселок Чунский (объект введен в 2021 году – дополнительное финансирование)	19 500,3	1 103,0	18 351,3	46,0	5,6	94,1	0,3
2	Нижнеудинское городское поселение (объект не введен в эксплуатацию в 2022 году)	303 441,4	12 117,6	290 818,3	505,5	4,0	95,8	0,2
3	Заларинское городское поселение (объект введен в эксплуатацию)	240 972,1	9 622,9	230 947,7	401,5	4,0	95,8	0,2

4	Шелеховский муниципальный район (объект не введен в эксплуатацию 2022 году)	243 621,3	9 728,7	233 486,7	405,9	4,0	95,8	0,2
5	Шелеховский муниципальный район (объект введен в эксплуатацию)	122 813,8	4 904,4	117 704,8	204,6	4,0	95,8	0,2
6	Иркутский муниципальный район (объект введен в эксплуатацию)	48 748,2	1 946,7	46 720,2	81,3	4,0	95,8	0,2
7	Сельское поселение «Покровка» (объект введен в эксплуатацию)	104 886,0	4 193,8	100 649,7	42,5	4,0	96,0	0,04
8	Сельское поселение «Забитуй» (объект введен в эксплуатацию)	135 915,3	5 427,6	130 261,2	226,5	4,0	95,8	0,2
9	Сельское поселение «Бохан» (ввод в эксплуатацию в 2023 году)	140 106,7	5 595	134 278,3	233,4	4,0	95,8	0,2
10	Осинский муниципальный район (ввод в эксплуатацию в 2023 году)	325 333,7	12 991,7	311 799,8	542,2	4,0	95,8	0,2
Всего		1 685 338,8	67 631,4	1 615 018,0	2 689,4	4,0	95,8	0,2
В том числе средства ОБ+ФБ		1 682 649,4						

Законом Иркутской области от 16.12.2021 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Закон № 130-ОЗ) в редакции от 06.12.2022 на реализацию РП «Чистая вода» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме **1 682 649,4 тыс. р.** Бюджетные ассигнования РП «Чистая вода» в Законе № 130-ОЗ предусмотрены по КВР 500 «Межбюджетные трансферты» распределены по 2 КЦСР:

- 1 663 195,1 тыс. р. предусмотрено для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

- 19 454,3 тыс. р. предусмотрено на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (дополнительное финансирование объекта, построенного в Чунском МО в связи с пересчетом стоимости строительных ресурсов).

Распределение субсидии на 2022-2024 годы на строительства и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения отражены в таблице 54 приложения № 14 к Закону № 130-ОЗ (редакция от 06.12.2022), таблица

тыс. р.

№	Наименования городских округов, муниципальных районов, поселений	2022 год	2023 год	2024 год
1	Городской округ Иркутск (1 объект)	0,0	101 946,5	0,0
2	Иркутский муниципальный район (5 объектов)	48 666,9	159 152,6	979 456,9
3	Шелеховский муниципальный район (2 объекта)	365 824,6	0,0	0,0
4	Осинский муниципальный район (1 объект)	324 791,5	559 635,4	0,0
5	Жигаловский муниципальный район (1 объект)	0,0	124 783,1	0,0
6	Нижнеудинское городское поселение (1 объект)	302 935,9	0,0	0,0
7	Заларинское городское поселение (1 объект)	240 570,6	0,0	0,0
8	Балаганское сельское поселение (1 объект)	0,0	52 061,7	0,0
9	Чунское муниципальное образование (дополнительное финансирование)	19 454,3	-	-
10	Вихоревское городское поселение (1 объект)	0,0	27 484,2,0	0,0
11	Бажирское сельское поселение (1 объект)	0,0	41 079,0	0,0
12	Покровское сельское поселение (1 объект)	104 843,5	0,0	0,0
13	Сельское поселение «Бохан» (1 объект)	139 873,3	274 743,8	0,0
14	Сельское поселение «Забитуй» (1 объект)	135 688,8	0,0	0,0
15	Холмогойское сельское поселение (1 объект)	0,0	22 057,5	0,0
16	Бабагайское сельское поселение (1 объект)	0,0	48 828,2	0,0
17	Харетское сельское поселение (1 объект)	0,0	35 416,7	0,0
ВСЕГО (21 объект)		1 682 649,4	1 447 188,7	979 456,9

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 01.01.2023 объем бюджетных ассигнований РП «Чистая вода» на 2022 год уточнен в сумме **1 685 438,7 тыс. р.**, что на 2 789,3 тыс. р. больше уровня, предусмотренного Законом № 130-ОЗ (в редакции от 06.12.2022) и ГП (в редакции от 19.12.2022).

Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год уточнены в сумме **1 685 438,7 тыс. р.** в разрезе направлений:

- 1 657 878, 9 тыс. р. предусмотрено на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;
- 27 559,8 тыс. р. предусмотрено на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (дополнительные средства предоставлены Чунскому МО в связи с пересчетом стоимости строительных ресурсов).

Согласно отчету об исполнении областного бюджета по национальным проектам (ф. 0503117-НП) расходы РП «Чистая вода» на 01.01.2023 исполнены в сумме 1 685 022,4 тыс. р. или на 99,98 % от утвержденных назначений (1 685 438,7 тыс. р.).

В 2022 году министерством предоставлены субсидии **9** МО на строительство объектов водоснабжения в сумме 1 685 022,4 тыс. р., в том числе:

- 240 564,5 тыс. р. администрации Заларинского МО на строительство локальных сетей водопровода мкр. Центральный р.п. Залари;
- 94 001,4 тыс. р. администрация МО «Покровка» на строительство централизованной системы водоснабжения в с.Покровка Баяндаевского района Иркутской области;
- 48 666,9 тыс. р. администрации Иркутского районного МО на строительство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской области;
- 272 572,4 тыс. р. администрации Шелеховского муниципального района на строительство водопроводных сетей в с.Введенщина, с. Баклаши, д. Олха.
- 423 347,9 тыс. р. администрации Осинского муниципального района на строительство системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей»;
- 139 873,3 тыс. р. администрации сельского поселения «Бохан» на строительство централизованной системы водоснабжения в п. Бохан Боханского района;
- 135 688,8 тыс. р. администрации сельского поселения «Забитуй» на строительство системы наружного водоснабжения в п. Забитуй Аларского района Иркутской области;
- 302 747,9 тыс. р. администрации МО г. Нижнеудинск на строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск.
- 27 559,2 тыс. р. администрации Чунского МО в связи с пересчетом стоимости строительных ресурсов за 2021 год по объекту строительства водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра п. Чунский.

В период реализации РП «Чистая вода» с 2019 по 2024 годы госпрограммой запланировано строительство **25 объектов** водоснабжения муниципальной собственности Иркутской области за счет средств федерального и областного бюджетов, с учетом софинансирования за счет средств местных бюджетов. По состоянию на 01.01.2023 года на территориях муниципальных образований Иркутской области за счет средств субсидии построено **9 объектов**, из них 4 объекта в период 2019-2021 годов и **5 объектов** водоснабжения введены в эксплуатацию в 2022 году.

Перечень объектов водоснабжения, построенные до 2022 года:

1) локальный водопровод в поселке Харик, Куйтунского района Иркутской области (13,9 км.), период строительства 2018 - 2019 годы, сметная стоимость строительства 95 728,1 тыс. р., в том числе ОБ - 3 824,4 тыс. р., ФБ - 91 785,3, тыс. р., МБ - 118,4 тыс. р.;

2) локальный водопровод в с.Баяндай, Баяндаевского района Иркутской области -11,3 км. (МО «Баяндай»), период строительства 2019 - 2020 годы, сметная стоимость строительства 101 076,5 тыс. р., в том числе ОБ - 4 036,7 тыс. р., ФБ - 96 871,5 тыс. р., МБ - 168,3 тыс. р.;

3) локальный водопровод в р.п.Залари, мкр. ЗМЗ, мкр. Целинстрой - 17 км. (Заларинское МО), период строительства 2019 - 2020 годы, сметная стоимость строительства 138 048,1 тыс. р., в том числе ОБ - 5 512,2 тыс. р., ФБ - 132 287,3 тыс. р., МБ - 248,6 тыс. р.;

4) водозаборные сооружения для питьевого водоснабжения из приустьевых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра поселка Чунский (2426 м³/сутки), период строительства 2020 - 2021 годы, сметная стоимость объекта - 207 563,5 тыс. р., в том числе средства ОБ – 8 617,0 тыс. р., ФБ -198 587,3 тыс. р., МБ – 359,2 тыс. р.

Объекты водоснабжения, введенные в эксплуатацию в 2022 году:

1) локальные сети водопровода мкр. Центральный р.п.Залари, период строительства 2022 год, сметная стоимость строительства 240 972,1 тыс. р., в том числе ОБ - 9 622,9 тыс. р., ФБ- 230 947,7 тыс. р., МБ - 401,5 тыс. р.;

2) водопроводные сети д.Олха, период строительства 2022 год, сметная стоимость строительства 122 813,8 тыс. р., в том числе ОБ -4 904,4 тыс. р., ФБ- 117 704,8 тыс. р., МБ- 204,6 тыс. р.;

3) магистральный водовод по улицам Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д.Сосновый Бор, Иркутского района, период строительства 2022 год, сметная стоимость строительства 48 748,2 тыс. р., в том числе ОБ – 1 946,7 тыс. р., ФБ - 46 720,2 тыс. р., МБ- 81,3 тыс. р.;

4) централизованная система водоснабжения в с.Покровка Баяндаевского района, период строительства 2022 год, сметная стоимость строительства 104 886,0 тыс. р., в том числе ОБ - 4 193,8 тыс. р., ФБ - 100 649,7 тыс. р., МБ - 42,5 тыс. р.;

5) система наружного водоснабжения в п.Забитуй Аларского района, период строительства 2022 год, сметная стоимость строительства 135 915,3 тыс. р., в том числе ОБ-5 427,6 тыс. р., ФБ-130 261,2 тыс. р. и МБ-226,5 тыс. р.

Объекты водоснабжения, завершение строительства которых планировалось в 2022 году, но не введенные в эксплуатацию:

1) городские водозаборные сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск, **период строительства 2021 - 2022 годы**, сметная стоимость строительства 725 062,4 тыс. р., том числе ОБ - 28 955,5 тыс. р., ФБ - 694 899,8 тыс. р. и МБ -1 207,1 тыс. р.;

2) водопроводные сети в Шелеховском районе (с.Введенщина - с. Баклаши), период строительства 2022 год, сметная стоимость строительства 243 621,3 тыс. р., в том числе ОБ-9 728,7 тыс. р., ФБ - 233 486,7 тыс. р. и МБ- 405,9 тыс. р.

В 2022 году на территориях МО начато строительство 2 объектов водоснабжения со сроком завершения работ в 2023 году: в МО «Бохан» начато строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан и в Осинском муниципальном районе начато строительство системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск» и МО «Ирхидей».

В 2023 году госпрограммой (в редакции от 19.12.2022) запланировано завершение строительства 12 объектов водоснабжения, в 2024 году – 2 объектов (всего в период реализации ГП за счет бюджетных средств запланировано строительство 25 объектов).

Кроме того, постановлением Правительства Иркутской области от 13.12.2022 № 991-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области» в перечень объектов РП «Чистая вода» на 2022 год включены 4 объекта водоснабжения, строительство которых осуществлялось за счет внебюджетных источников муниципальным образованием город Иркутск на сумму 1 099 040,0 тыс. р.:

- 1) сети водоснабжения по ул. Андреева, 37д, корп. «б»;
- 2) водопроводная линия по ул. Воровского, 11 до ул. Генерала Доватора, 1;
- 3) реконструкция водопроводной сети в мкр. Зеленый;
- 4) сети водоснабжения до границ земельных участков, расположенных по ул. Лесная, 65 и ул. Павла Красильникова, 97/1.

Госпрограммой в редакции от 19.12.2022 № 1022-пп установлены целевые показатели, характеризующие исполнение РП «Чистая вода» на территории Иркутской области, таблица:

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	74,0	74,0	74,0	76,3	75,1	77,4	80,2	87,5
Доля городского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	89,2	89,2	89,2	90,1	90,3	93,6	94,8	99,5
Доля сельского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	17,5	17,5	17,5	17,8	18,6	20,2	22,7	27,3
Количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом	0	0	1	3	4	11	23	25

В интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» на 2022 год показатель по количеству построенных и реконструированных объектов водоснабжения, предусмотренных РП, нарастающим итогом составляет - 11 ед., а показатель доля населения Иркутской области обеспеченного качественной питьевой водой из центрального водоснабжения составляет - 81%, для городского населения этот показатель составляет - 95,2%.

2. Анализ соглашений, заключенных между федеральными органами исполнительной власти и Правительством Иркутской области; министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области с органами местного самоуправления.

Реализация РП «Чистая вода» в 2022 году осуществлялась за счет софинансирования из федерального бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-209, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Иркутской области (далее – Соглашение № 069-09-2022-209).

В соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения № 069-09-2022-209 Правительством Иркутской области приняты обязательства - обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 4 к Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

В 2022 году к Соглашению № 069-09-2022-209 подписано 8 дополнительных Соглашений, которыми уточнены объемы финансирования и значения результатов использования субсидии, в том числе:

- дополнительным Соглашением от 14.12.2022 № 069-09-2022-209/7 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, предусмотрен в сумме 1 685 216,5 тыс. р., из них объем субсидии из федерального бюджета - 1 617 807,3 тыс. р. или 96%. В областном бюджете на 01.01.2023 объем финансирования РП «Чистая вода» составил 1 685 438,7 тыс. р., что на 222,2 тыс. р. больше, чем в Соглашении № 069-09-2022-209.

- дополнительным Соглашением от 29.12.2022 № 069-09-2022-209/8 уточнены значения результатов использования субсидии, установленные пунктом 4.3.3 Соглашения № 069-09-2022-209. По направлению расходов «Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» результатами использования субсидии установлено значение **на 31.12.2022 - завершено строительство** и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом **11 объектов**.

В 2022 году министерством в соответствии со статьей 139 БК РФ, Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 03.02.2020 № 56-пп, заключены 10 соглашений с МО Иркутской области (субсидии предоставлены по 9 Соглашениям):

1) соглашение с администрацией Вихоревского городского поселения от 14.03.2022 № 25604103-1-2022-002, которым предусмотрено финансирование строительства объекта водоснабжения в сумме 27 530,0 тыс. р., из них объем субсидии из областного бюджета - 27 484,2 тыс. р. В Электронном бюджете размещено дополнительное соглашение от 26.04.2022 № 25604103-1-2022-002/1 о расторжении Соглашения от 14.03.2022 № 25604103-1-2022-002. В 2022 году объект не финансировался, завершение строительства запланировано на 2023 год;

2) соглашение с администрацией Нижнеудинского МО от 28.01.2022 № 25628101-1-2022-002 с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Нижнеудинского МО, в сумме 303 441,4 тыс. р., из них субсидия ОБ - 302 935,9 тыс. р. Министерством предоставлена субсидия муниципальному образованию в сумме 302 747,9 тыс. р.;

3) соглашение с администрацией Заларинского МО от 10.02.2022 № 25608151-1-2022-003 с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Заларинского МО, в сумме 240 972,1 тыс. р., из них субсидия ОБ - 240 570,6 тыс. р. Министерством предоставлена субсидия муниципальному образованию в сумме 240 564,5 тыс. р.;

4) соглашение с администрацией Шелеховского муниципального района от 10.02.2022 № 25655000-1-2022-006 (в редакции дополнительного соглашения от 16.12.2022 № 25655000-1-2022-006/4) с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО Шелеховский район, в сумме 273 027,2 тыс. р., из них субсидия ОБ – 272 572,5 тыс. р. Министерством предоставлена субсидия муниципальному образованию в сумме 272 572,4 тыс. р.;

5) соглашение с администрацией Иркутского районного МО от 17.02.2022 № 25612000-1-2022-006, с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутского районного МО, в сумме 48 748,2 тыс. р., из них субсидия ОБ - 48 666,9 тыс. р. Министерством предоставлена субсидия муниципальному образованию в сумме 48 666,9 тыс. р.;

б) соглашение с администрацией МО «Покровка» от 10.02.2022 № 25607434-1-2022-001 (в редакции дополнительного Соглашения от 16.12.2022 № 25607434-1-2022-001/4) с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Покровка», в сумме 94 039,5 тыс. р., из них субсидия ОБ – 94 001,4 тыс. р. Министерством предоставлена субсидия муниципальному образованию в сумме 94 001,4 тыс. р.;

7) соглашение с администрацией МО «Забитуй» от 15.02.2022 № 25605414-1-2022-00 с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Забитуй», в сумме 135 915,3 тыс. р., из них субсидия ОБ - 135 688,8 тыс. р. Министерством предоставлена субсидия муниципальному образованию в сумме 135 688,8 тыс. р.;

8) соглашение с администрацией МО «Бохан» от 10.02.2022 № 25609405-1-2022-002, в редакции дополнительного соглашения от 15.07.2022 № 25609405-1-2022-002/1 с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Бохан» в 2022 году 140 106,7 тыс. р. (субсидия ОБ - 139 873,3 тыс. р.) и в 2023 году 275 202,4 тыс. р. (субсидия ОБ – 274 743,8 тыс. р.). Министерством предоставлена субсидия муниципальному образованию в объеме 139 873,3 тыс. р., завершение строительства объекта запланировано на 2023 год.

9) соглашение с администрацией Осинского муниципального района от 16.02.2022 № 25631000-1-2022-003 (в редакции дополнительного соглашения от 20.12.2022 № 25631000-1-2022-003/3) с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Осинского муниципального в 2022 году – 424 053,5 тыс. р., из них субсидия из ОБ – 423 347,9 тыс. р. Министерством предоставлена субсидия муниципальному образованию в сумме 423 347,9 тыс. р., завершение строительства запланировано на 2023 год;

10) соглашение с администрацией Чунского МО от 09.08.2022 № 25650151-1-2022-002 (в редакции дополнительного соглашения от 16.12.2022 № 25650151-1-2022-002/2) с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чунского МО в 2022 году в сумме 27 605,2 из них объем субсидии – 27 559,2 тыс. р. Министерством предоставлены субсидии в сумме 27 559,2 тыс. р. в целях дополнительного финансирования объекта, строительство которого завершено в 2021 году (пересчет стоимости строительных ресурсов за 2021 год).

3. Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию РП «Чистая вода», их исполнение на отчетную дату; оценка заключенных и исполненных муниципальных контрактов с указанием объема финансирования по объектам водоснабжения

Согласно отчетам об исполнении бюджетов по национальным проектам по состоянию на 01.01.2023 (форма 0503117-НП) в местных бюджетах предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 1 687 944,9 тыс. р., из которых исполнено 1 687 715,4 тыс. р., или 99,99% от утвержденных назначений, таблица.

	тыс. р.			
Муниципальное образование	КВР	Утверждено	Исполнено	%
Заларинское городское поселение	414	240 972,3	240 966,0	100,0
Иркутский муниципальный район	414	48 748,2	48 748,2	100
Нижнеудинское городское поселение	414	303 441,4	303 253,1	99,9
Осинский муниципальный район	414	424 087,7	424 053,5	100,0
Сельское поселение Бохан	414	140 106,7	140 106,7	100
Сельское поселение Забитуй	414	135 915,3	135 915,3	100
Сельское поселение Покровка	414	94 040,2	94 040,2	100
Чунское городское поселение	414	27 606,0	27 605,2	100,0

Шелеховский муниципальный район	414	273 027,2	273 027,1	100,0
ВСЕГО	х	1 687 944,9	1 687 715,4	99,99

Как видно из таблицы, в 2022 году расходы на реализацию РП «Чистая вода» предусмотрены в бюджетах 9 МО Иркутской области в общем объеме 1 687 944,9 тыс. р. Расходы местных бюджетов направлены по КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

1. В бюджете *Заларинского городского поселения* предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 240 972,3 тыс. р., расходы местного бюджета на реализацию РП составили 240 966,0 тыс. р. или 100 % от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству локальных сетей водопровода мкр. Центральный р. п. Залари заключен администрацией Заларинского МО с ООО «Крот» от 06.12.2021 по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме 0134200000121004758 (по итогам конкурса цена снижена на 7 039,5 тыс. р. или 3,1%). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена контракта составляла 227 609,9 тыс. р., срок выполнения работ до 01.11.2022. В редакции дополнительного соглашения к контракту от 10.11.2022 сумма контракта составила 235 967,7 тыс. р. Срок исполнения 30.12.2022.

Согласно данным ЕИС на 30.12.2022 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 235 967,7 тыс. р. (100%), фактически оплачено – 110 714,8 тыс. р. (47%). Ввод в эксплуатацию локальных сетей водопровода мкр. Центральный р. п. Залари подтвержден Актом приемки законченного строительством объекта от 23.12.2022 № 1.

2. В бюджете *Иркутского районного муниципального образования* предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 48 748,2 тыс. р., из которых исполнено 48 748,2 тыс. р. или 100% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству магистральных водопроводных сетей по ул. Ленина, ул. Урожайная, ул. Новая, ул. Таежная в деревне Сосновый Бор, Иркутского района заключен Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования с ООО «ГостСтрой» от 23.11.2021 № ЭА-80/21 по итогам проведения электронного конкурса в электронной форме № 0134300019421000035 (по итогам конкурса цена снижена на 2 029,9 тыс. р. или 10 %). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена контракта составляет 18 269,2 тыс. р., срок выполнения работ по 10.11.2022. В редакции дополнительного соглашения сумма контракта составила 20 299,1 тыс. р. Срок исполнения 31.12.2022.

Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость исполненных подрядчиком обязательств и фактически оплаченных составила 20 299,1 тыс. р. (100%). Кроме того, средства субсидии в сумме 26 607,9 тыс. р. направлены МО на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения. Ввод в эксплуатацию магистральных водопроводных сетей по ул. Ленина, ул. Урожайная, ул. Новая, ул. Таежная в деревне Сосновый Бор, Иркутского района подтвержден Актом приемки законченного строительством объекта от 26.10.2022 №1.

3. В бюджете *Нижнеудинского МО* на 2022 год предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 303 441,4 тыс. р., из которых исполнено 303 253,1 тыс. р. или 99,9% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск заключен администрацией Нижнеудинского МО с ООО «Стройинвест» от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21 по итогам открытого аукциона № 0134200000121000543. Контракт заключен с единственным участником по начальной

максимальной цене аукциона. В соответствии с пунктами 2.2, 3.1 контракта № 1367-ЭА/21 цена контракта составила 699 350,5 тыс. р., срок выполнения работ до 01.09.2022 года. Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость исполненных подрядчиком обязательств и фактически оплаченных составила 699 346,1 тыс. р. (100%).

Согласно пункту 4.21 контракта № 1367-ЭА/21 объект признается построенным со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта сторонами и при наличии заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

По факту акт приемки законченного строительством объекта (**КС-11**) в 2022 году **не подписан, фактически строительство** городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск **не завершено**.

Согласно информации администрации Нижнеудинского муниципального образования от 11.10.2022 № 6805, направленной в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, в ходе строительства объекта в установленном законодательством порядке подтвержден дополнительный объем работ, неучтенных в проектной документации, прошедшую государственную экспертизу, без которых завершить строительство объекта и ввод его в эксплуатацию не предоставляется возможным. Стоимость дополнительных работ, неучтенных в проектной документации составляет 72 997,6 тыс. р., из которой дополнительное финансирование за счет средств областного бюджета - 69 935,0 тыс. р.

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 24.12.2022 № 069-09-2023-331 на строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск в 2023 году предусмотрены бюджетные средства за счет всех источников в сумме 69 390,8 тыс. р., в том числе средства областного и федерального бюджетов - 69 275,3 тыс. р.

В настоящее время **дополнительное соглашение к контракту** от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21, предусматривающее завершение строительства городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск, в 2023 году, **не заключено**.

4. В бюджете *Осинского муниципального района* предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 424 087,7 тыс. р., из которых исполнено 424 053,5 тыс. р. или 100% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха - Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей» заключен администрацией Осинского муниципального района от 12.01.2022 № 45 с ООО «Иркутские буровые работы» по результатам открытого конкурса в электронной форме № 0134200000121005481 (в ходе аукциона цена контракта снижена на 26 577,2 тыс. р. или 3%). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 цена контракта составляет 859 323,9 тыс. р., срок выполнения работ по контракту установлен до 30.11.2023. Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость исполненных и фактически оплаченных по контракту работ составляет 416 373,3 тыс. р. (48,5%).

5. В бюджете *сельского поселения «Бохан»* предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 140 106,7 тыс. р., из которых исполнено 140 106,7 тыс. р. или 100 % от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан заключен администрацией муниципального образования «Бохан» с ООО «Водоканал-Сервис» от 12.01.2022 № 93 по итогам электронного аукциона № 0134200000121006207 (в ходе аукциона цена контракта снижена на 4 031,2 тыс. р. или 1,0%). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 цена контракта составляет

399 083,6 тыс. р., срок выполнения работ по контракту до 15.11.2023. Согласно данным ЕИС по состоянию на 31.12.2022 стоимость исполненных и фактически оплаченных по контракту работ составляет 135 087,4 тыс. р. (33,8%).

6. В бюджете *сельского поселения «Забитуй»* предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в объеме 135 915,3 тыс. р., из которых исполнено 135 915,3 тыс. р. или 100% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство системы водоснабжения в п. Забитуй Аларского района Иркутской области заключен администрацией муниципального образования «Забитуй» с ООО «Арсенал» от 11.01.2022 № 01 по итогам открытого конкурса в электронной форме № 0134300005621000001. В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составила 132 866,9 тыс. р., срок выполнения работ по контракту до 01.12.2022. По состоянию на 31.12.2022 стоимость исполненных и фактически оплаченных работ составляет 132 866,9 тыс. р. (100%).

Ввод в эксплуатацию объекта - системы водоснабжения в п. Забитуй Аларского района Иркутской области подтвержден Актом приемки законченного строительством объекта от 26.12.2022 б/н.

7. В бюджете *сельского поселения «Покровка»* предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 94 040,2 тыс. р., из которых исполнено 94 040,2 тыс. р. или 100% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство локального водопровода в с. Покровка Баяндаевского района заключен администрацией муниципального образования «Покровка» с ООО «Иркутские буровые работы» от 31.12.2021 № ЭК/9-21. В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составила 89 560,11 тыс. р., срок выполнения работ по контракту 30.11.2022.

Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость исполненных и фактически оплаченных работ составляет 89 560,11 тыс. р. (100%). Ввод в эксплуатацию локального водопровода в с. Покровка Баяндаевского района подтвержден Актом приемки законченного строительством объекта № 1 от 30.11.2022.

8. В бюджете *МО «Шелеховский район»* предусмотрены расходы местного бюджета на 2022 год на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 273 027,2 тыс. р., из которых исполнено 273 027,2 тыс. р. или 100% от утвержденных назначений.

В целях реализации на территории Шелеховского района РП «Чистая вода» Управлением территориального развития и обустройства администрации Шелеховского муниципального района заключены 2 муниципальных контракта:

- муниципальный контракт на строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Веденщина – с. Баклаши) заключен с ООО «Строймонтаж» от 09.02.2022 № 08/2022 по итогам открытого конкурса в электронной форме № 0134200000121005657 (по итогам конкурса цена контракта снижена на 16 497,4 тыс. р. или 7,2%). В соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 контракта цена составляет 213 000,0 тыс. р., срок выполнения работ установлен до 01.12.2022. Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость исполненных и фактически оплаченных работ составляет 143 646,4 тыс. р. (67,4%).

Согласно пункту 4.20. контракта № 08/2022 объект признается построенным со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта. В 2022 году **Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) не подписан, фактически строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Веденщина – с. Баклаши) в 2022 году не завершено.**

Дополнительным соглашением от 07.12.2022 к контракту от 09.02.2022 № 08/2022 срок окончания строительства продлен до 01.09.2023 года. Согласно письму

Правительства Иркутской области от 23.11.2022 № 02-58-7228/22 в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации водопроводные сети объекта частично проходят (500 м) по участку лесного фонда, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации. Завершению строительно-монтажных работ препятствует отсутствие акта натурного технического обследования участка лесного фонда (далее – Акт). По информации Департамента военного имущества Минобороны России предоставление Акта возможно в случае рассмотрения вопроса по постановке на государственный кадастровый учет участка лесного фонда, на котором расположен объект строительства за счет средств федерального бюджета, но не ранее 2023 года.

Согласно заявке на финансирование за счет средств областного бюджета на 2023 год, направленной администрации Шелеховского муниципального образования от 31.10.2022 № 6125/2022-исх в министерство, общая сумма строительства водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Веденщина – с. Баклаши) составляет 70 235,9 тыс. р., из них средства областного бюджета 70 119,0 тыс. р.

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 24.12.2022 № 069-09-2023-331 в 2023 году на строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Веденщина – с. Баклаши) предусмотрены средства за счет всех источников в сумме 70 235, 9 тыс. р., из них средства областного и федерального бюджетов - 70 119,0 тыс. р.

Предоставление субсидии муниципальным образованиям Иркутской области осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 03.02.2020 № 56-пп (далее - Положение № 56-пп).

Согласно пункту 6 Положения № 56-пп одним из условий предоставления субсидии является - наличие документов, подтверждающих право муниципальной собственности на объекты питьевого водоснабжения (в части реализации мероприятий **по реконструкции (модернизации) объектов** питьевого водоснабжения).

Учитывая изложенное, целесообразно дополнить Положение № 56-пп условиями, предусматривающими предоставление субсидии **на строительство объектов водоснабжения** при наличии права муниципальной собственности либо права пользования земельными участками, на которых запланировано проведение строительных работ.

- муниципальный контракт на строительство водопроводных сетей д. Олха заключен с ООО «БайкалЭнергоСетьСтрой» от 14.02.2022 № 9/2022 по итогам открытого конкурса в электронной форме № 0334300041421000155 (по итогам конкурса цена контракта снижена на 1 115,2 тыс. р. или 1,1%. В соответствии с пунктами 2.1, 3.1 контракта цена контракта составляет 97 407,1 тыс. р., срок выполнения работ до 01.12.2022. Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 года стоимость исполненных подрядчиком обязательств и фактически оплаченных составила 97 407,1 тыс. р. (100%). Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей д. Олха Шелеховского района подтвержден Актом приемки законченного строительством объекта от 30.11.2022 б/н.

Согласно отчету об исполнении бюджета Чунского городского поселения на 01.01.2023 (форма 0503117 – НП) в 2022 году в бюджете Чунского городского поселения утверждены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 27 606,0 тыс. р.,

финансовое исполнение составило 27 605,2 тыс. р. (дополнительные средства предоставлены в связи с пересчетом стоимости строительных ресурсов за 2021 год).

В 2021 году администрацией Чунского муниципального образования за счет средств субсидии завершено строительство водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра поселка Чунский. Строительство объекта в п. Чунский велось в рамках муниципального контракта от 27.08.2020 № 10/20, заключенного между администрацией Чунского МО и ООО «Энергостроительная компания». В соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 муниципального контракта № 10/20 цена контракта составляет 176 708,9 тыс. р., срок выполнения работ до 20.12.2021. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано главой администрации Чунского МО от 30.12.2021 № 38-526103-13-2021.

В связи с пересчетом стоимости строительных ресурсов за 2021 год администрацией Чунского МО подписано дополнительное соглашение к контракту, согласно которому цена контракта увеличена на 27 605,2 тыс. р. и составила 204 314,1 тыс. р. (176 708,9 тыс. р. + 27 605,2 тыс. р.). Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость исполненных и фактически оплаченных работ составляет 204 314,1 тыс. р. (100%).

Вместе с тем, **введенный в 2021 году в эксплуатацию объект «водозаборные сооружения для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский» не эксплуатируется.**

По состоянию на 26.01.2023 на официальном сайте администрации Чунского МО (ссылка - <https://xn--80aybgvx.xn--p1ai/bloks/raspc.html>) размещено Распоряжение № 632-ОД от 29.12.2022 «О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества». Согласно Распоряжению администрации Чунского МО № 632-ОД отделу по управлению муниципальным имуществом необходимо обеспечить организацию проведения конкурса, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества: водозаборные сооружения, являющиеся единым недвижимым комплексом, находящиеся в собственности Чунского МО.

В соответствии с пунктом 1.4 извещения о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (объект водоснабжения) в 2022 администрацией Чунского МО объявлено 5 конкурсов на право аренды в период с 20.06.2022 по 29.12.2022, которые признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок (участников). Согласно пункту 4.1 извещения о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (объект водоснабжения), срок предоставления конкурсной документации участниками установлен с 09.01.2023 по 08.02.2023.

4. Оценка достижения целевых показателей и выполнения контрольных точек, установленных для реализации РП «Чистая вода» в ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», наличие рисков их не достижения.

В декабре 2022 года двумя постановлениями Правительства Иркутской области в ГП утверждены разные значения плановых целевых показателей, характеризующие реализацию РП «Чистая вода» в 2022 году (постановления Правительства Иркутской области от 13.12.2022 № 991-пп и от 19.12.2022 № 1022-пп). Установленные показатели имеют разночтения, в том числе с показателями, размещенными в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», таблица

Плановый показатель	Постановление правительства Иркутской области от 19.12.2022 № 1022-пп.	Постановление правительства Иркутской области от 13.12.2022 № 991-пп	Электронный бюджет
Доля населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	77,4	77,4	81
Доля городского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	93,6	93,6	95,2
Доля сельского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	20,2	20,2	-
Количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом	11	15	11

На 01.01.2023 показатель, установленный в Приложении № 4 к Соглашению № 069-09-2022-209 (результат использования Субсидии) достигнут министерством на 9 ед., из установленных 11 ед. (завершение строительства 2 объектов, расположенных в г. Нижнеудинск и Шелеховском районе перенесено на 2023 год).

В 2022 году за счет **внебюджетных источников** в г. Иркутске завершено строительство 4 объектов водоснабжения, которые включены в перечень объектов РП «Чистая вода» постановлением Правительства Иркутской области от 13.12.2022 № 991-пп. Всего по состоянию на 31.12.2022 в Иркутской области в рамках РП «Чистая вода» завершено строительство 13 объектов (9 + 4).

В отчете о ходе реализации РП «Чистая вода» по состоянию на 31.12.2022, утвержденным заместителем министра жилищной политики и энергетики Иркутской области, отражено завершение строительства 14 объектов, в том числе отражен 1 объект, строительство которого ведется в рамках подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы, который не относится к объектам строительства РП «Чистая вода» (сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6 «Б», г. Саянск).

Таким образом, плановый показатель, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 13.12.2022 № 991-пп (15 ед.) и фактическое количество построенных объектов, отраженных в отчете о ходе реализации РП «Чистая вода» на 31.12.2022 (14 ед.) **не соответствует фактическому количеству объектов водоснабжения**, построенных в период реализации РП «Чистая вода». Ключевые риски исполнения РП «Чистая вода» в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» отсутствуют.

Основные выводы

1. РП «Чистая вода» реализуется в рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы (действующая редакция ГП утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 19.12.2022 № 1022-пп).

2. В период реализации РП «Чистая вода» с 2019 по 2024 годы госпрограммой запланировано строительство 25 объектов водоснабжения муниципальной собственности Иркутской области за счет средств федерального и областного бюджетов, с учетом

софинансирования из местных бюджетов. В 2022 году РП «Чистая вода» завершено строительство 4 объектов водоснабжения в г. Иркутске за счет внебюджетных источников.

3. Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2022 год (в редакции госпрограммы от 19.12.2022 № 1022-пп) без учета средств местных бюджетов и иных источников утверждено в сумме 1 682 649,4 тыс. р. (ОБ - 67 631,4 тыс. р. и ФБ - 1 615 018,0 тыс. р.). По сравнению с 2021 годом ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» увеличено на 1114 813,9 тыс. р. или 196,3% (с 2019 года + 870,9%). В 2022 году средства федерального бюджета на реализацию РП «Чистая вода» предоставлены по Соглашению от 29.12.2021 № 069-09-2022-209, заключенному между Минстроем РФ и Правительством Иркутской области.

4. Законом Иркутской области от 16.12.2021 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 06.12.2022) на реализацию РП «Чистая вода» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 1 682 649,4 тыс. р., которые уточнены сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2023 в сумме 1 685 438,7 тыс. р. (+ 2 789,3 тыс. р.).

Согласно отчету об исполнении областного бюджета по национальным проектам (ф. 0503117-НП) расходы РП «Чистая вода» на 01.01.2023 исполнены в сумме 1 685 022,4 тыс. р. или на 99,98 % от утвержденных назначений, в том числе средства ФБ - 1 617 621,3 тыс. р. (96%) и ОБ - 67 401,1 (4%).

5. В 2022 году министерством предоставлены субсидии на реализацию РП «Чистая вода» 9 МО Иркутской области, в том числе 8 МО на строительство объектов водоснабжения в сумме 1 657 463,2 тыс. р. и 1 МО в связи с пересчетом стоимости строительных ресурсов за 2021 год в сумме 27 559,2 тыс. р.

6. Согласно отчетам об исполнении бюджетов по национальным проектам на 01.01.2023 (форма 0503117-НП) в местных бюджетах предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 1 687 944,9 тыс. р., из которых исполнено 1 687 715,4 тыс. р. или 99,99% от утвержденных назначений. Расходы предусмотрены в бюджетах 9 МО на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности.

7. В ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» на 2022 год установлен показатель - количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом – 11 ед.

По факту за счет средств субсидий, предоставленных из федерального и областного бюджета, построено 9 объектов водоснабжения (нарастающим итогом), за счет внебюджетных источников в 2022 году в г. Иркутске завершено строительство 4 объектов водоснабжения. Ключевые риски исполнения РП «Чистая вода» в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» по состоянию на 01.01.2023 отсутствуют.

8. В 2022 году за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета по Соглашению № 069-09-2022-209, планировалось завершить строительство 11 объектов (нарастающим итогом). По состоянию на 01.01.2023 два объекта водоснабжения не введены в эксплуатацию, завершение работ перенесено на 2023 год:

- по объекту строительства в г. Нижнеудинске необходима корректировка проектной документации и дополнительное финансирование за счет всех источников в сумме 69 390,8 тыс. р.,

- по объекту строительства в Шелеховском районе необходимо документальное оформление земельного участка лесного фонда, принадлежащего Министерству обороны РФ.

9. В 2021 году администрацией Чунского муниципального образования за счет средств субсидии завершено строительство водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из приустьевых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра поселка Чунский. Стоимость контракта составила 204 314,2 тыс. р., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано главой администрации Чунского МО от 30.12.2021 № 38-526103-13-2021.

Введенный в 2021 году в эксплуатацию объект водоснабжения до настоящего времени не эксплуатируется. В период с 20.06.2022 по 29.12.2022 администрацией Чунского МО проведено 5 конкурсов на право аренды муниципального имущества, которые не состоялись по причине отсутствия участников.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Направить настоящее заключение в Законодательное Собрание Иркутской области.

Аудитор КСП Иркутской области

Ю.В. Гамзулин
