



## Мониторинг реализации регионального проекта Иркутской области «Чистая вода» за 2022 год

*Руководитель экспертно-  
аналитического мероприятия –  
аудитор Гамзулин Юрий Викторович*

## Общие сведения об экспертно-аналитическом мероприятии.

РП «Чистая вода» реализуется в рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп.

Ответственным исполнителем подпрограммы и РП «Чистая вода» является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

## Анализ соглашений заключенных с министерством строительства РФ и органами самоуправления


Реализация РП «Чистая вода» осуществлялась за счет софинансирования из федерального бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-209, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Иркутской области.

В ходе реализации РП «Чистая вода» подписано 8 дополнительных соглашений, в том числе:

- дополнительным Соглашением от 14.12.2022 № 069-09-2022-209/7 общий объем бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в сумме 1 685 216,5 тыс. р., из них объем субсидии из федерального бюджета - 1 617 807,3 тыс. р. или 96% (4% приходится на софинансирование из ОБ).

- дополнительным Соглашением от 29.12.2022 № 069-09-2022-209/8 уточнены значения результатов использования субсидии, установленные пунктом 4.3.3 Соглашения № 069-09-2022-209. По направлению расходов «Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» результатами использования субсидии установлено значение **на 31.12.2022 - завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом 11 объектов.**

## Динамика изменений ресурсного обеспечения РП «Чистая вода» в период с 2019 по 2022 года

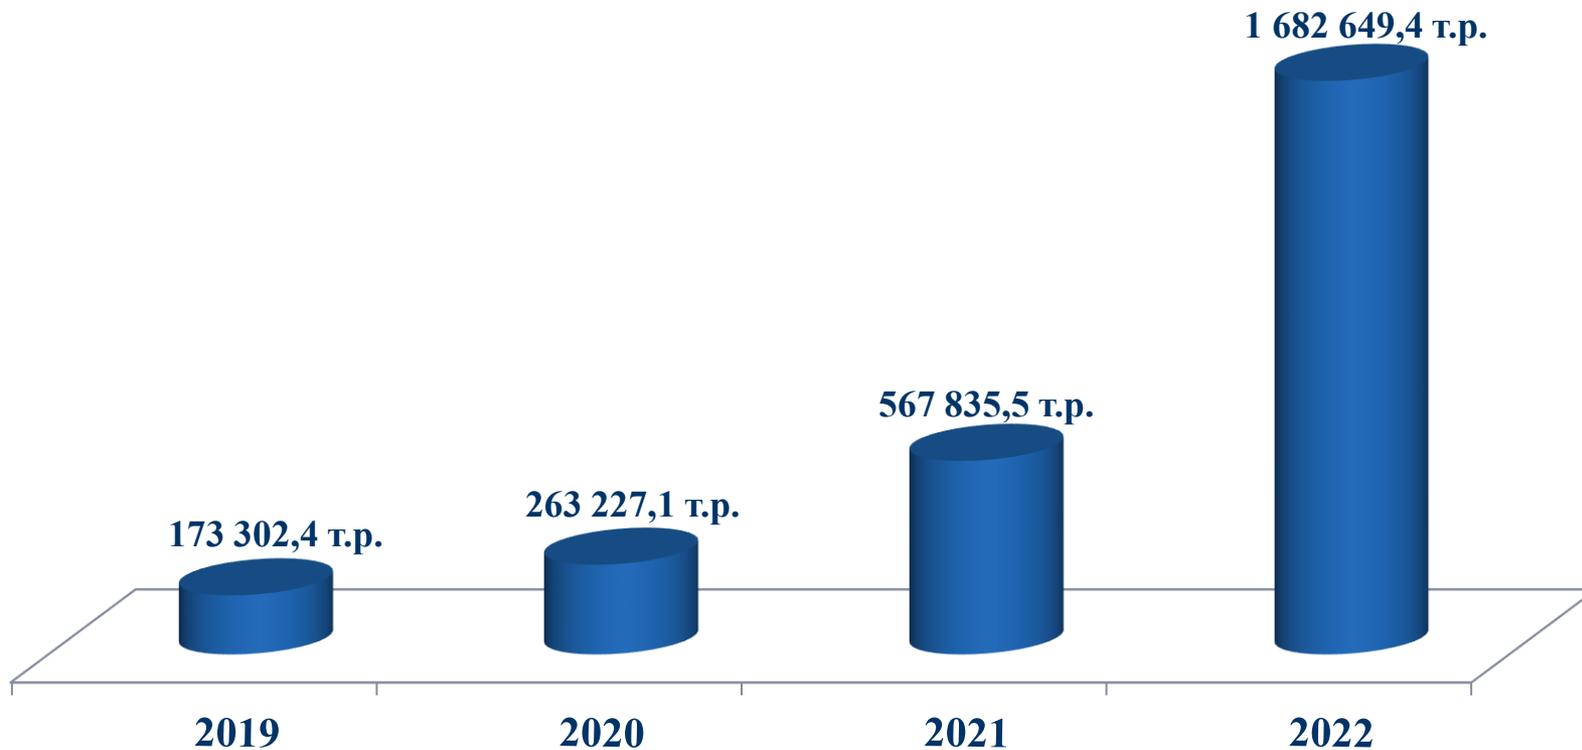

Как видно из диаграммы объемы финансирования РП «Чистая вода» с 2019 года по 2022 год выросли на 870,9%. (с 173 302,4 тыс. р. до 1 682 649,4 тыс. р.).

## Финансирование РП «Чистая вода» в 2022 году в разрезе МО Иркутской области

№	Наименование округов, районов, поселений.	Всего	ОБ	ФБ	МБ	% соотношение, %		
						ОБ	ФБ	МБ
1	Поселок Чунский (объект введен в 2021 году – дополнительное финансирование)	19 500,3	1 103,0	18 351,3	46,0	5,6	94,1	0,3
2	Нижнеудинское городское поселение (объект не введен в эксплуатацию в 2022 году)	303 441,4	12 117,6	290 818,3	505,5	4,0	95,8	0,2
3	Заларинское городское поселение (объект введен в эксплуатацию)	240 972,1	9 622,9	230 947,7	401,5	4,0	95,8	0,2
4	Шелеховский муниципальный район (объект не введен в эксплуатацию 2022 году)	243 621,3	9 728,7	233 486,7	405,9	4,0	95,8	0,2
5	Шелеховский муниципальный район (объект введен в эксплуатацию)	122 813,8	4 904,4	117 704,8	204,6	4,0	95,8	0,2
6	Иркутский муниципальный район (объект введен в эксплуатацию)	48 748,2	1 946,7	46 720,2	81,3	4,0	95,8	0,2
7	Сельское поселение «Покровка» (объект введен в эксплуатацию)	104 886,0	4 193,8	100 649,7	42,5	4,0	96,0	0,04
8	Сельское поселение «Забитуй» (объект введен в эксплуатацию)	135 915,3	5 427,6	130 261,2	226,5	4,0	95,8	0,2
9	Сельское поселение «Бохан» (ввод в эксплуатацию в 2023 году)	140 106,7	5 595	134 278,3	233,4	4,0	95,8	0,2
10	Осинский муниципальный район (ввод в эксплуатацию в 2023 году)	325 333,7	12 991,7	311 799,8	542,2	4,0	95,8	0,2
<b>Всего</b>		1 685 338,8	67 631,4	1 615 018,0	2 689,4	4,0	95,8	0,2
<b>В том числе средства ОБ+ФБ</b>		1 682 649,4						

## Бюджетные ассигнования предусмотренные в местных бюджетах на реализацию РП «Чистая вода»


Согласно отчетам об исполнении бюджетов по состоянию на 01.01.2023 (форма 0503117-НП) в местных бюджетах предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 1 687 944,9 тыс. р., из которых исполнено 1 687 715,4 тыс. р. или 99,99% от утвержденных назначений.

тыс.р.

Муниципальное образование	Утверждено	Исполнено	%
Заларинское городское поселение	240 972,3	240 966,0	100,0
Иркутский муниципальный район	48 748,2	48 748,2	100
Нижнеудинское городское поселение	303 441,4	303 253,1	99,9
Осинский муниципальный район	424 087,7	424 053,5	100,0
Сельское поселение Бохан	140 106,7	140 106,7	100
Сельское поселение Забитуй	135 915,3	135 915,3	100
Сельское поселение Покровка	94 040,2	94 040,2	100
Чунское городское поселение	27 606,0	27 605,2	100,0
Шелеховский муниципальный район	273 027,2	273 027,1	100,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 687 944,9</b>	<b>1 687 715,4</b>	<b>99,99</b>

## Вихоревское городское поселение

Финансирование и ввод объекта: станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 м<sup>3</sup>/сут. в 2022 году не предусмотрено. Отказ от реализации мероприятия в рамках муниципального контракта от 28.09.2020 № 168 с ООО «ЭкоРесурс» на строительство объекта связан с решением администрации Вихоревского городского поселения от 03.08.2021 о расторжении контракта в связи с необходимостью **повторного прохождения государственной экспертизы**. Завершение строительства запланировано на 2023 год (строительство объекта ведется с 2020 года).

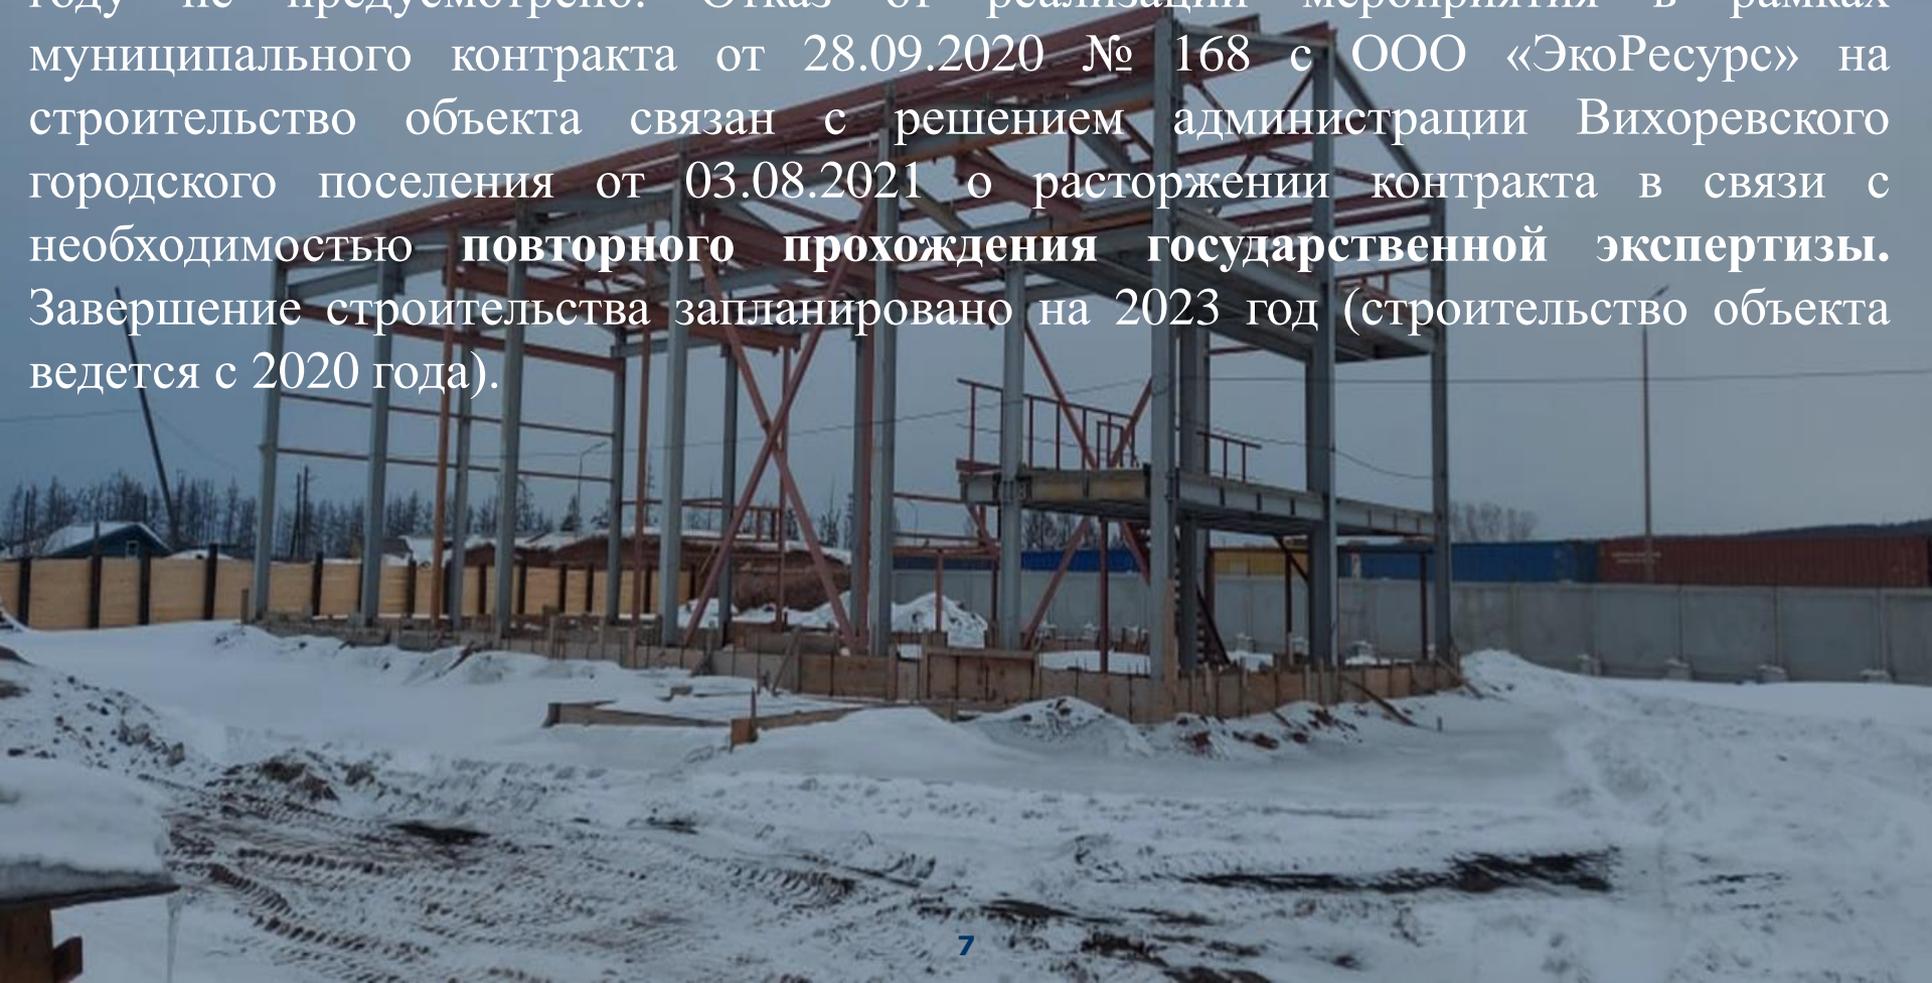

# Нижнеудинское МО

По факту акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) в 2022 году не подписан, фактически плановое строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск не завершено.

В ходе строительства объекта в установленном законодательством порядке подтвержден дополнительный объем работ, неучтенных в проектной документации, прошедшую государственную экспертизу, без которых завершить строительство объекта и ввод его в эксплуатацию не предоставляется возможным.

Стоимость дополнительных работ, неучтенных в проектной документации составляет 72 997,6 тыс. р., из которой дополнительное финансирование за счет средств

областного бюджета - 69 935,0 тыс. р.

Дополнительное соглашение к контракту от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21, предусматривающее завершение строительства городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск, в 2023 году не заключено.



## МО Шелеховский район



**Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) не подписан, фактически плановое строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Веденщина – с. Баклаши) в 2022 году не завершено.**

Водопроводные сети объекта частично проходят (500 м) по участку лесного фонда, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации. Завершению строительно-монтажных работ препятствует отсутствие акта натурного технического обследования участка лесного фонда (письмо Правительства Иркутской области от 23.11.2022 № 02-58-7228/22 в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации). По информации Департамента военного имущества Минобороны России предоставление Акта возможно в случае рассмотрения вопроса по постановке на государственный кадастровый учет участка лесного фонда, на котором расположен объект строительства за счет средств федерального бюджета, но не ранее 2023 года.

# Чунское МО



В 2021 году администрацией Чунского муниципального образования за счет средств субсидии завершено строительство водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра поселка Чунский. Строительство объекта в п. Чунский велось в рамках

муниципального контракта от 27.08.2020 № 10/20, заключенного между администрацией Чунского МО и ООО «Энергостроительная компания». В соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 муниципального контракта № 10/20 цена контракта составляет 176 708,9 тыс. р., срок выполнения работ до 20.12.2021. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано главой администрации Чунского МО от 30.12.2021 № 38-526103-13-2021.

Введенный в 2021 году в эксплуатацию объект «водозаборные сооружения для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский» не эксплуатируется.

По состоянию на 26.01.2023 на официальном сайте администрации Чунского МО размещено Распоряжение № 632-ОД от 29.12.2022 «О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества». Согласно Распоряжению администрации Чунского МО № 632-ОД отделу по управлению муниципальным имуществом необходимо обеспечить организацию проведения конкурса, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества: водозаборные сооружения, являющиеся единым недвижимым комплексом, находящиеся в собственности Чунского МО.

В соответствии с пунктом 1.4 извещения о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (объект водоснабжения) в 2022 году администрацией Чунского МО объявлено 5 конкурсов на право аренды в период с 20.06.2022 по 29.12.2022, которые признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок (участников). Согласно пункту 4.1 извещения о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (объект водоснабжения), срок предоставления конкурсной документации участниками установлен с 09.01.2023 по 08.02.2023



## Оценка достижения целевых показателей

На 01.01.2023 целевой показатель «Количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой» достигнут на 9 ед., из установленных 11 ед. (завершение строительства 2 объектов, расположенных в г. Нижнеудинск и Шелеховском районе перенесено на 2023 год).

Вместе с тем, в 2022 году за счет **внебюджетных источников** в г. Иркутске завершено строительство 4 объектов водоснабжения, которые включены в перечень объектов РП «Чистая вода» постановлением Правительства Иркутской области от 13.12.2022 № 991-пп.

В отчете о ходе реализации РП «Чистая вода» по состоянию на 31.12.2022 отражено завершение строительства 14 объектов, в том числе отражен 1 объект, строительство которого ведется в рамках подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы, который не относится к объектам строительства РП «Чистая вода» (сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона б «Б», г. Саянск).

Плановый показатель, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 13.12.2022 № 991-пп (15 ед.) и фактическое количество построенных объектов, отраженных в отчете о ходе реализации РП «Чистая вода» на 31.12.2022 (14 ед.) **не соответствует фактическому количеству объектов водоснабжения, построенных в период реализации РП «Чистая вода».**



**Спасибо за внимание!**

[www.irksp.ru](http://www.irksp.ru)
