



Проверка законности и результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области».

*Руководитель контрольного мероприятия – аудитор
Гамзулин Юрий Викторович*

Общие сведения о контрольном мероприятии

- ❖ **Объекты проверки:**
 - Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;
 - Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
 - Администрация Молодежного муниципального образования;
 - Администрация Карлукского муниципального образования;
 - Администрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

- **Проверяемый период: 2020-2021 года**

- ❖ **Объем проверенных средств – 783 857,9 тыс. рублей**

- ❖ **Объем нарушений – 50 557,6 тыс. рублей**


Расходы бюджета на реализацию РП «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» в 2020 году (тыс. р.).

| № | Мероприятия регионального проекта | Утверждено | Исполнено | % |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 275 000,0 | 275 000,0 | 100,0 |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 101 960,5 | 101 645,7 | 99,7 |
| 3 | Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды (оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий) | 1 199 083,9 | 1 187 107,6 | 99,0 |
| 4 | Цифровизация городского хозяйства | 2 900,0 | 2 900,0 | 100,0 |
| ВСЕГО | | 1 578 944,4 | 1 566 653,3 | 99,2 |

Расходы бюджета на реализацию РП «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» в 2021 году (тыс. р.).

| № | Мероприятия регионального проекта | Утверждено | Исполнено | % |
|--------------|---|-------------|-------------|------|
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 383 922,0 | 381 998,5 | 99,5 |
| 2 | Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды (оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий) | 1 166 372,5 | 1 156 286,8 | 99,1 |
| 3 | Реализация программ формирования современной городской среды и техническое сопровождение и поддержка информационной системы «Моя Иркутская область» | 3 100,2 | 2 200,2 | 70,9 |
| ВСЕГО | | 1 553 394,7 | 1 540 485,5 | 99,2 |

Благоустройство дворовых и общественных территорий в 2020 – 2021 годах

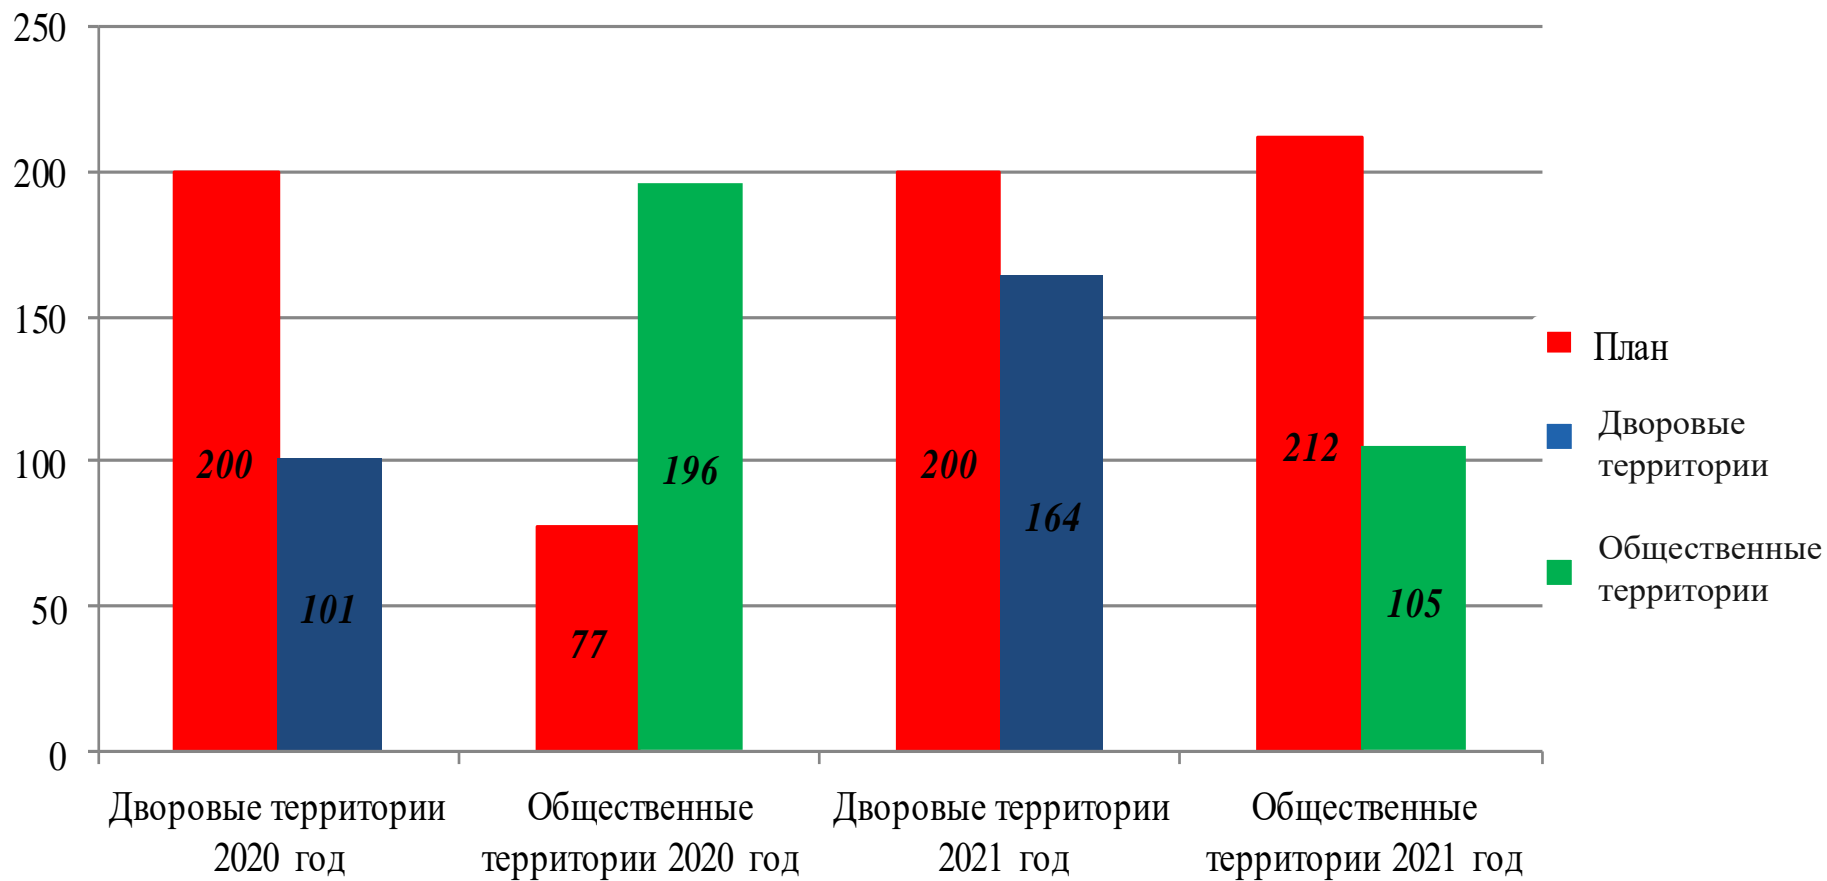

Основные замечания и недостатки, выявленные контрольным мероприятием.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2021 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, с несоблюдением пунктов 35-37 Положения № 568-пп:

- предоставило субсидию Ханжиновскому МО на благоустройство общественной территории в завышенной объеме на сумму 191,7 тыс. р.;**
- предоставило субсидию Большееланскому МО на благоустройство общественных и дворовых территорий в завышенном объёме на 89,9 тыс. р.;**
- предоставило субсидию в завышенном объеме Усть-Удинскому МО на сумму 28,5 тыс. р.;**
- предоставило субсидию на 2021 год в заниженном объеме Уриковскому МО на 1 236,2 тыс. р.**

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2021 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, в нарушение пункта 46 Положения № 568-пп, распоряжения Правительства Иркутской области № 498-рп не верно рассчитало общий объем субсидий в части расходов местных бюджетов в сумме 49 763,3 тыс. р. В соглашениях с 21 МО Иркутской области общий объем расходов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий за счет средств местного бюджета определен Министерством меньше на сумму 686,2 тыс. р. В Соглашениях по 63 МО Иркутской области общий объем расходов местных бюджетов рассчитан больше на сумму 49 077,1 тыс. р.


Благоустройство дворовой территории по адресу: д. Карлук, пер. Фабричный, д.7



Администрацией Карлукского МО в 2021 году в рамках РП при принятии работ по благоустройству дворовой территории, расположенной в д. Карлук, пер. Фабричный, 7, выполненных в рамках соглашения от 27.10.2020 № 4, заключенного администрацией с ООО «Спорт-Контур», допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 546,2 тыс. р. (статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета – 542,3 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения по обустройству асфальтового покрытия в объеме 178 кв. м. и бортовых камней в количестве 235 шт. (на общую сумму 546,2 тыс. р.) устранены администрацией в полном объеме.

Благоустройство дворовых и общественных территорий г.Усолье-Сибирское

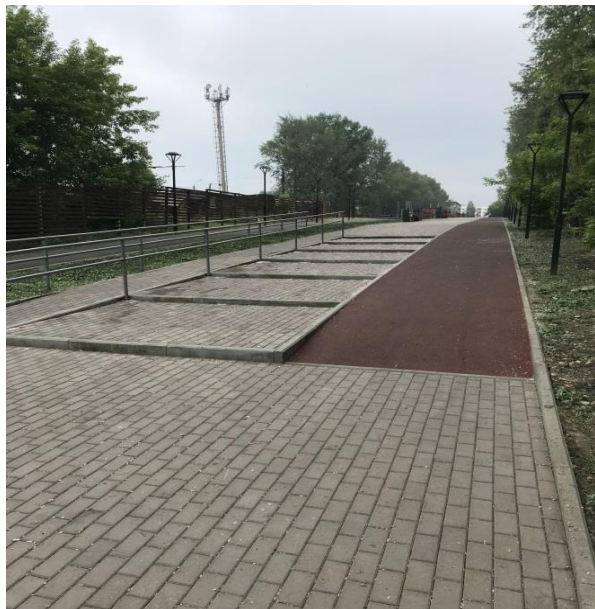

Администрацией МО город Усолье-Сибирское в 2021 году в рамках исполнения двух муниципальных контрактов (МК № 443/2020 с ООО «ВестТрейд» и МК от 31.05.2021 № 233/2021 с ООО «ТИГРАН»), заключенных на благоустройство двух общественных территорий - сквера по проезду Серегина города Усолье-Сибирское и «Озеро Молодежное» допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 523,2 тыс. р. (статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета - 512,2 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьями 158 БК РФ.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения устранены администрацией в полном объеме.

Благоустройство общественной территории г. Усолье-Сибирское (сквер по проезду Серегина)



В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству общественной территории «сквер по проезду Серегина» установлено отсутствие фактически выполненных работ: по посадке кустарников (0,5 тыс. р.).

Так же установлено повреждение 7 лавочек, карусели (отсутствуют сиденья и стерто резиновое покрытие).



Благоустройство общественной территории г. Усолье-Сибирское (озеро Молодежное)




В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству общественной территории «Озеро Молодежное» установлено отсутствие фактически выполненных работ: по обустройству бортовых камней (368,5 тыс. р.); установке светильников, фонарей, парковых осветительных комплектов (103,5 тыс. р.), качалки на пружине МК-21/1 «Оптима» (35,8 тыс. р.), по посадке кустарников (8,9 тыс. р.)

Благоустройство дворовых и общественных территорий г. Иркутска



Комитетом городского благоустройства администрации города Иркутска в 2021 году при использовании бюджетных средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию регионального проекта при принятии выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 138,1 тыс. р., в том числе средства областного бюджета – 115,9 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ.

Благоустройство дворовой территории г. Иркутск (ул. Марата 15/1, 15/2)

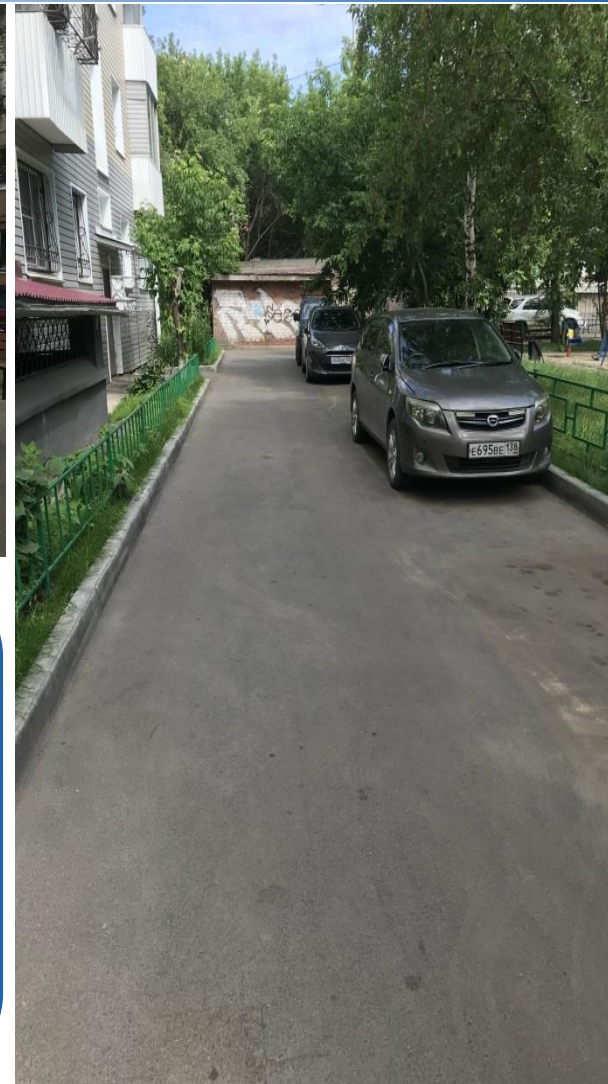

В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству дворовой территории по ул. Марата 15/1, 15/2 установлено, что фактически не выполнены работы по устройству покрытия из асфальта в объеме 11 кв. м., по посадке деревьев (3 шт.) на общую сумму 25,4 тыс. р.

Благоустройство дворовой территории г. Иркутска (ул. Марата 29, 31)



В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству дворовой территории по ул. Марата 29, 31 установлено отсутствие фактически выполненных работ по устройству бордюрного камня в объеме 10 м на сумму 8,1 тыс. р.

Благоустройство дворовой территории г. Иркутска (ул. Киренская, д. 4)




В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству **дворовой территории по ул. Киренская, д. 4** установлено, что фактически не выполнены работы по обустройству газонов в объеме 50 кв. м. и по посадке деревьев в количестве 8 шт. на общую сумму 30,2 тыс. р.

По результатам вырубки асфальтового покрытия установлено, что толщина асфальта в отдельных местах тротуарных покрытий составляет 2,8 см при минимально допустимой и принятой актами выполненных работ - 3 см, асфальтные покрытия имеют трещины, в связи с чем указанные недостатки подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам.

Общественная территория «мкр. Академгородок (северная часть) от ул. Улан-Баторская до развязки Академического моста»

В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству общественной территории «мкр. Академгородок (северная часть) от ул. Улан - Баторская до развязки Академического моста» установлено отсутствие выполненных работ: по посеву газонов в объеме 51,4 кв. м., по посадке многолетних цветов в клумбы в количестве 268 шт. на общую сумму 38,3 тыс. р.


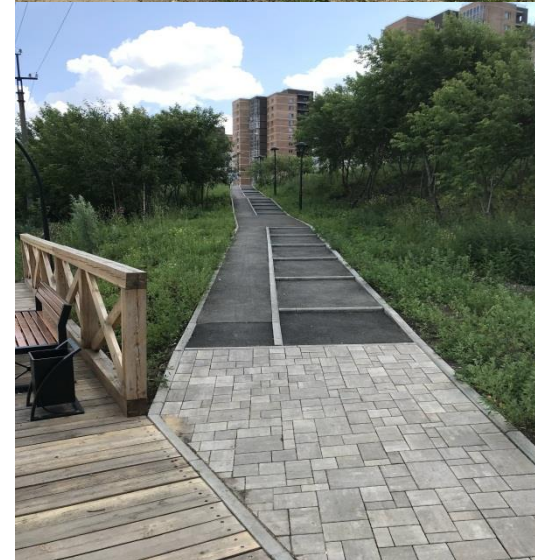


Общественная территории «ул. Волжская от дома № 14-А до дома № 15»



В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству общественной территории «ул. Волжская от дома №14-А до дома №15» установлено, что фактически не выполнены работы по установке вазонов в количестве 10 шт. на сумму 63 тыс. р. По информации представленной КГО г. Иркутск произошло хищение вазонов после их установки.

Общественная территория «ул. Нижняя Набережная» (1 этап)

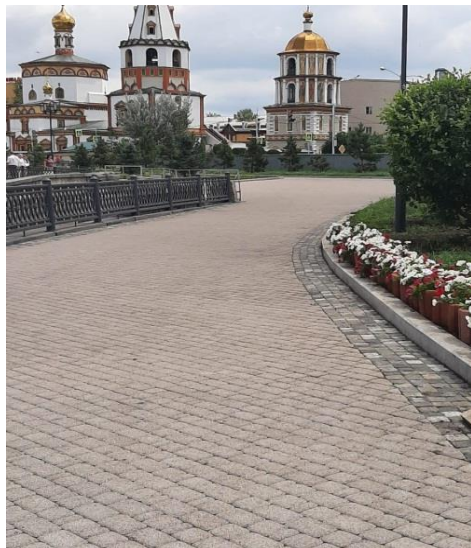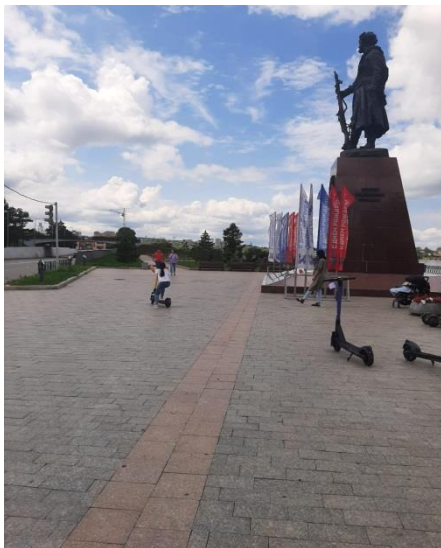

В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству общественной территории «ул. Нижняя Набережная» (1 этап) установлено отсутствие фактически выполненных работ по посадке кустарников (10 шт.) на сумму 36,1 тыс. р.





Спасибо за внимание!

www.irksp.ru
