


## **Анализ устранения замечаний по контрольному мероприятию**

**«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, направленных в 2015 году в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы на строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта»**


<b>Наименование объекта</b>	<b>Год начала строительства</b>	<b>Сметная стоимость объекта на 01.01.15</b>
<b>Строительство плавательного бассейна в г.Шелехов, проспект Центральный</b>	<b>2013</b>	<b>114 469,5</b>
<b>Строительство плавательного бассейна в г.Черемхово по ул. 1-я Лермонтова, 6</b>	<b>2013</b>	<b>92 721,3</b>
<b>Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс в с.Еланцы Ольхонского района»</b>	<b>2014</b>	<b>124 000,0</b>
<b>Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нижнеудинск, ул. Максима Горького, 11»</b>	<b>2013</b>	<b>84 267,3</b>
<b>Реконструкция спортивного комплекса в Аларском районе, п. Кутулик, ул. Вампилова, 19а</b>	<b>2015</b>	<b>61 084,4</b>
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>476 542,5</b>

## Плавательный бассейн в г.Черемхово, ул. 1-я Лермонтова, 6

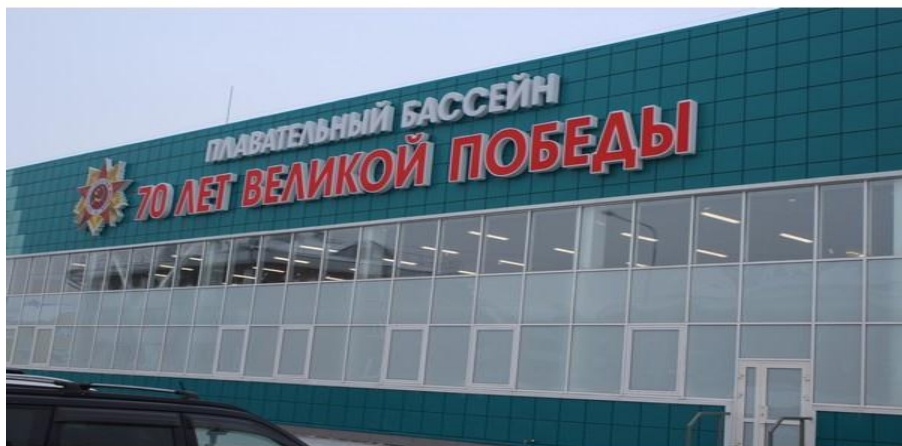

По информации финотдела  
кредиторская задолженность в  
сумме 2 562,5 тыс. рублей  
30.12.2016 оплачена по полном  
объеме.

Тарифы –  
дети (до 5 лет бесплатно),  
школьники (50 руб.), ПТУ – (100 р. ),  
взрослые – (200 р.) за 1 час

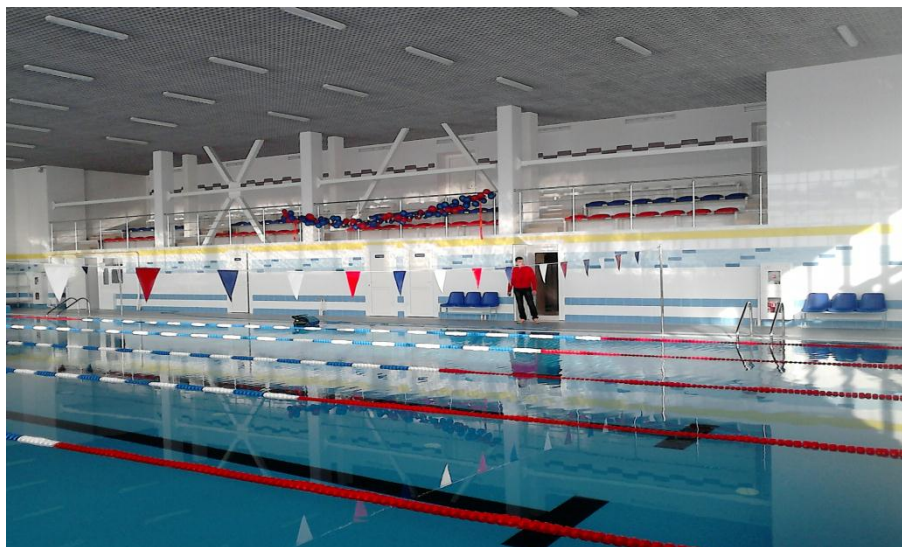

## Универсальный спортивный комплекс в с.Еланцы Ольхонского района



Работы по благоустройству территории проведены (посажены 50 елок и берез)



Посещение спорткомплекса – бесплатно



## Реконструкция спортивного комплекса в Аларском районе, п. Кутулик, ул. Вампилова, 19а



**Замечания –  
отсутствуют вентиляция,  
пожарная сигнализация  
(~ 3 млн. рублей),  
Объект не введен в  
эксплуатацию с июня  
2015 года**



**Выделено в 2016 году  
дополнительно из областного  
бюджета - 7 790,0 тыс. рублей,  
введен в эксплуатацию с  
27.12.2016,  
посещение – бесплатно**

# Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нижеудинск, ул. Максима Горького, 11

февраль 2016 года



В настоящее время



На 2017 год  
предусмотрено для  
завершения  
строительства и  
обеспечения ввода в  
эксплуатацию 5 767,7  
тыс. рублей.



# Плавательный бассейн в г.Шелехов, проспект Центральный



**Замечания : ООО «Ново-Строй», стоимость 114 469,5 тыс. рублей, объект функционирует, не представлена (отсутствует) система осушения воздуха, высокая влажность, отсутствие оборудования (приточная установка)**

---



**Согласно письмам от 01.09.2016 № 278/1 и 09.11.2016 № 3695/16 администрации Шелеховского МО в адрес ООО «Ново-Строй» предложено допоставить отсутствующее оборудование, либо вернуть излишне оплаченные суммы (2,4 млн.).**



**Согласно письму в КСП области от 31.01.2017 №255/17 – отказ от претензий.**

---

## **Тарифы**

**1 посещение : 150–180 руб.**

**Занятия у тренера для детей:**

**– 2600 рублей в месяц**

**Объем проверенных средств – 406 885,1 тыс. рублей:**

- 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 124 035 тыс. рублей, 6 ед.**
- 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 ед.**
- 3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 1 ед.**
- 4. Иные нарушения – 660,2 тыс. рублей.**

**Итоги: По всем объектам меры приняты, за исключением Шелеховского ГП**

**ФОК в Нижнеудинском ГП – ввод в 2017 год,  
Спорткомплекс в Кутулике Аларского района – введен в декабре 2016 года.**

**Кредиторская задолженность в г. Черемхово - погашена**



**СПАСИБО!**
